

## 民間保育園の開園時期の延期について

保健福祉部

令和2年4月の民間保育園3園の開園に向け、整備運営事業者による施設整備が進められているが、次の保育園について開園時期の延期が見込まれるため報告する。

## 1 対象保育園

- (1) 施設名称 (仮称) スクルドエンジェル保育園 もくし園  
(2) 整備運営事業者 株式会社 スクルドアンドカンパニー  
(3) 施設予定地 君津市杵師四丁目7番1ほか  
(4) 入所定員 75人

内訳	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳
	6人	12人	12人	15人	15人	15人

## 2 経緯

整備運営事業者が8月に実施した入札は不調となり、10月4日に再度実施した入札で現工事請負業者が落札したが、台風15号等による災害に伴い、建設工事の開始に必要な仮設電気工事の実施が約1か月遅延したこと及び屋根工事に係る資材調達等の手配が難航したことにより、当初の完了予定時期が遅れ、6月開園の見込みとなった。

## 3 開園までの間の対応策

令和2年4月入園希望の保護者に対し、6月開園になる旨の周知を行い、改めて入園申込について意向確認を行う。


意向確認後、6月開園までの代替保育を希望する保護者に対しては、整備運営事業者が臨時的に用意する保育施設や、既存の保育園での受入れについて検討する。

## 4 今後のスケジュール

- 12月下旬～1月上旬 同園への入園希望保護者に対する周知及び意向確認  
1月中旬～2月上旬 入園調整及び保育園入園承諾書の送付  
6月1日 (仮称) スクルドエンジェル保育園もくし園開園予定

※ (仮称) ウェルネス保育園君津、(仮称) あい・あい保育園君津園については、予定どおり令和2年4月1日に開園する見込みである。

認可保育園整備運営事業者  
施設予定地 位置図

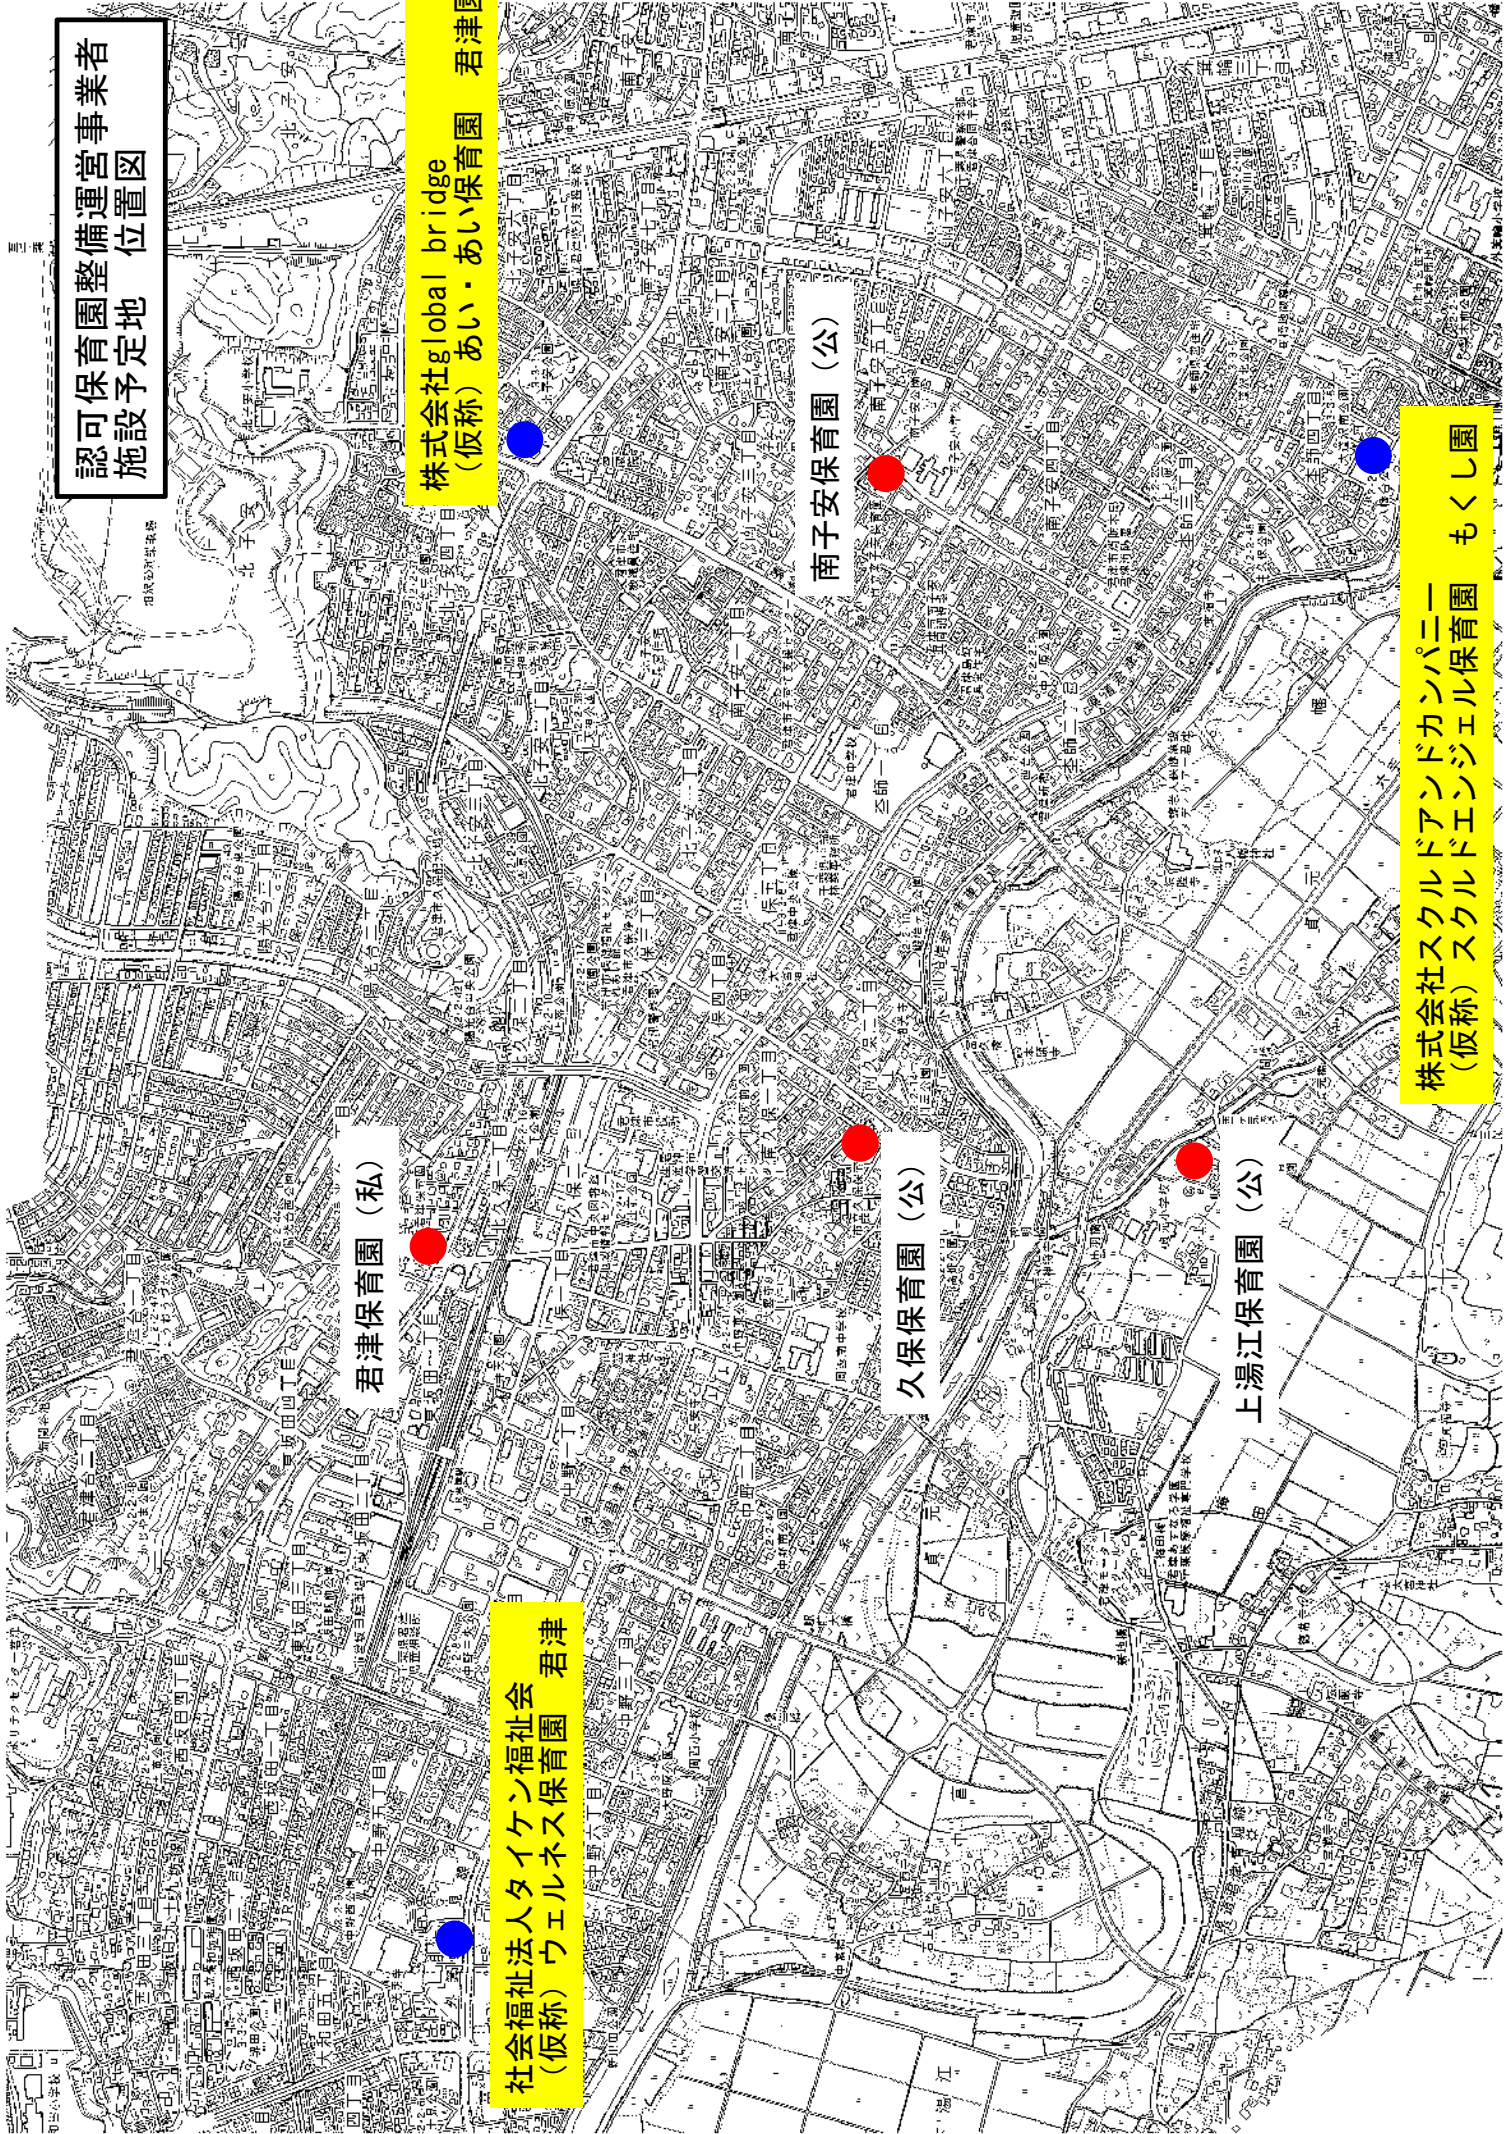

君津保育園 (私)

久保保育園 (公)

上湯江保育園 (公)

南子安保育園 (公)

社会福祉法人タイケン福祉会  
(仮称) ウェルネス保育園 君津

株式会社 global bridge  
(仮称) あい・あい保育園 君津園

株式会社 スクルドアンドカンパニー  
(仮称) スクルドエンジニアリング保育園 もくし園
